

Climairlys

12 Rue de la Part-Dieu 69003 Lyon
07 45 07 14 77
contact@climairlys.fr

Client

Camille Martin

12 rue Exemple
M 38110 La Tour-du-Pin
06 00 00 00 00
client.exemple@example.com

Intervention

Adresse : 12 rue Exemple
38110 La Tour-du-Pin
Date : 15/06/2026

Responsable : Technicien Climairlys
Nombre de techniciens : 1

Prises de mesures pour le calcul du gain de rendement

Vitesses de soufflage

Avant nettoyage

3,04m/s

Après nettoyage

3,61m/s

Amélioration du rendement de la vitesse de soufflage


Le nettoyage a permis d'augmenter la vitesse de 0.57 m/s, soit un gain de 18.9 % par rapport à la vitesse initiale.

Compte-rendu photos

Vitesse de soufflage et T°C, Avant / Après



Protocole de protection

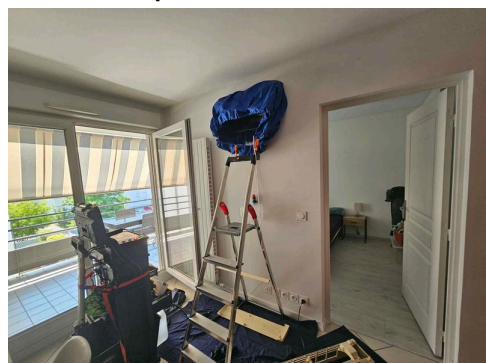


Évaporateur, Avant / Après



Turbine, Avant / Après



Bac à condensats, Avant / Après

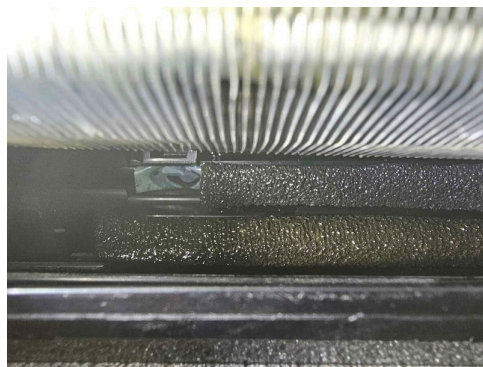

Récupération des déchets



Signature masquée sur cet exemple public

